

DESARROLLO DEL SUMIDERO -90RL

PLANEAMIENTO DE MINA

ACTIVIDADES DE MINA + DEWATERING



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Resumen de actividades

Capacidad del sumidero

150K m³

Total de toneladas por minar

2.99 Mtonnes

SHE03 MA

91%

Promedio de la actividad de la pala

100 wmt/dia

Fecha de inicio de minado

Sept. 27th

Fecha de completitud de
minado


Nov. 06th

Días de actividad

41

Secuencia de minado de -90RL

Semanas	Días
W 39-40	8
W 41	7
W 42	7
W 43-44	9

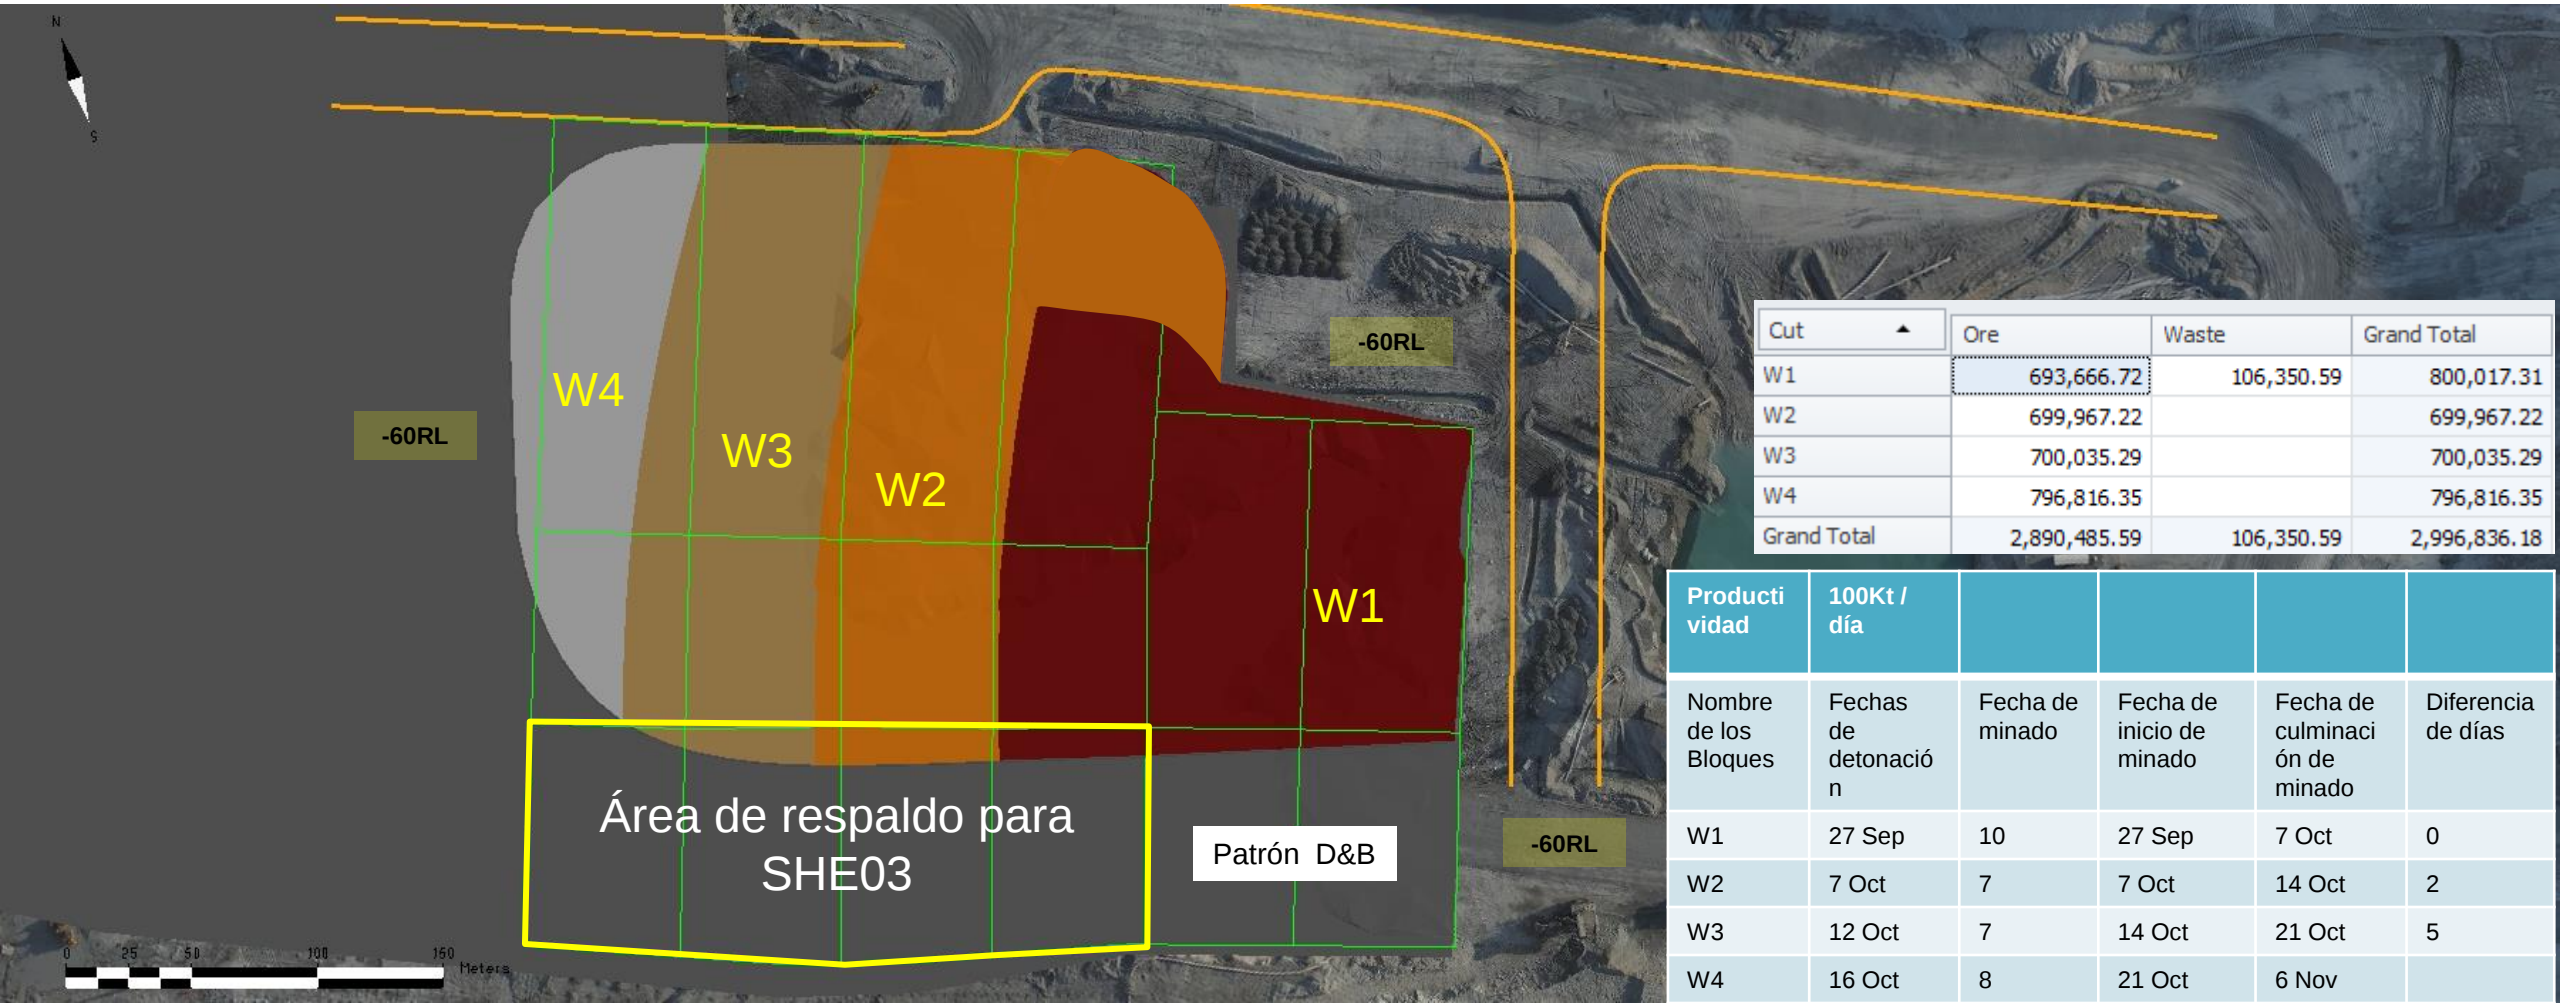


Cut	Ore	Waste	Grand Total
W1	693,666.72	106,350.59	800,017.31
W2	699,967.22		699,967.22
W3	700,035.29		700,035.29
W4	796,816.35		796,816.35
Grand Total	2,890,485.59	106,350.59	2,996,836.18

Producti vidad	100Kt / día				
Nombre de los Bloques	Fechas de detonaci ón	Fecha de minado	Fecha de inicio de minado	Fecha de culminaci ón de minado	Diferencia de días
W1	27 Sep	10	27 Sep	7 Oct	0
W2	7 Oct	7	7 Oct	14 Oct	2
W3	12 Oct	7	14 Oct	21 Oct	5
W4	16 Oct	8	21 Oct	6 Nov	

Secuencia de minado de -90RL

Nota: La primera semana, SHE03 planificó una productividad de 80 kt/día mientras minaba la rampa.

Semanas	Días
W 39-40	8
W 41	7
W 42	7
W 43-44	9

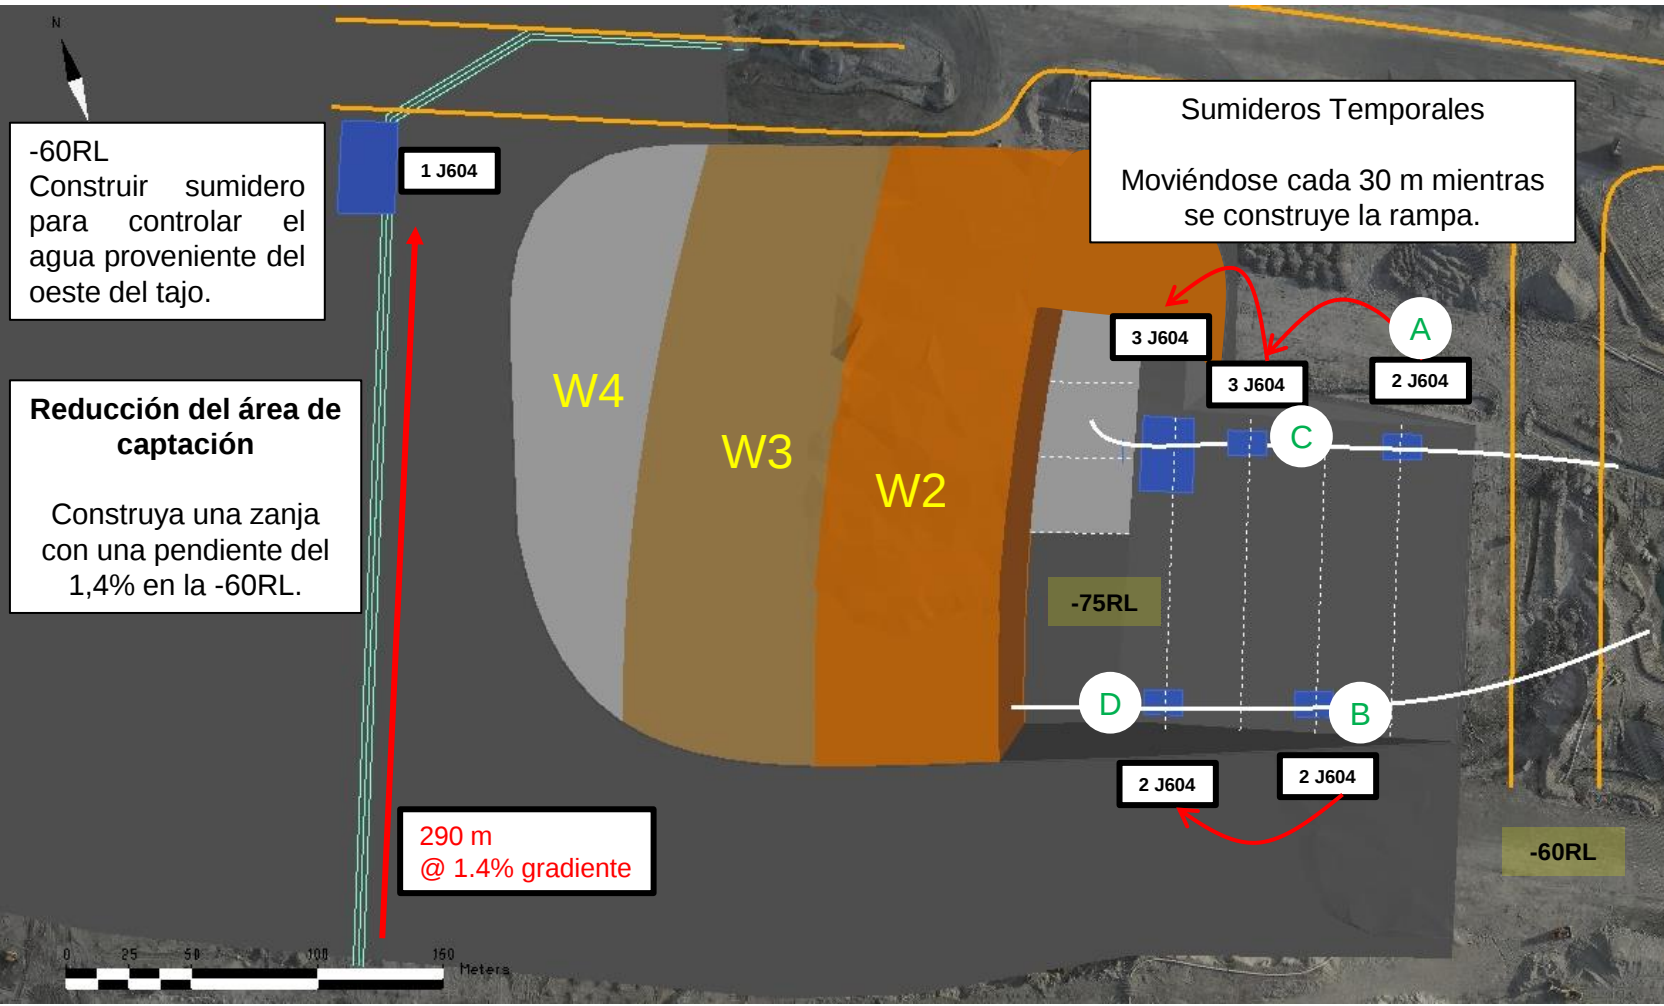


Cut	Ore	Waste	Grand Total
W1	693,666.72	106,350.59	800,017.31
W2	699,967.22		699,967.22
W3	700,035.29		700,035.29
W4	796,816.35		796,816.35
Grand Total	2,890,485.59	106,350.59	2,996,836.18

Producti vidad	100Kt / día				
Nombre de los Bloques	Fechas de detonación	Fecha de minado	Fecha de inicio de minado	Fecha de culminación de minado	Diferencia de días
W1	27 Sep	10	27 Sep	7 Oct	0
W2	7 Oct	7	7 Oct	14 Oct	2
W3	12 Oct	7	14 Oct	21 Oct	5
W4	16 Oct	8	21 Oct	6 Nov	

Secuencia de minado de -90RL

Nota: la cuarta semana de octubre, SHE03 comenzará a minar de -75RL a -87,5RL

Semanas	Días
W 39-40	8
W 41	7
W 42	7
W 43-44	9

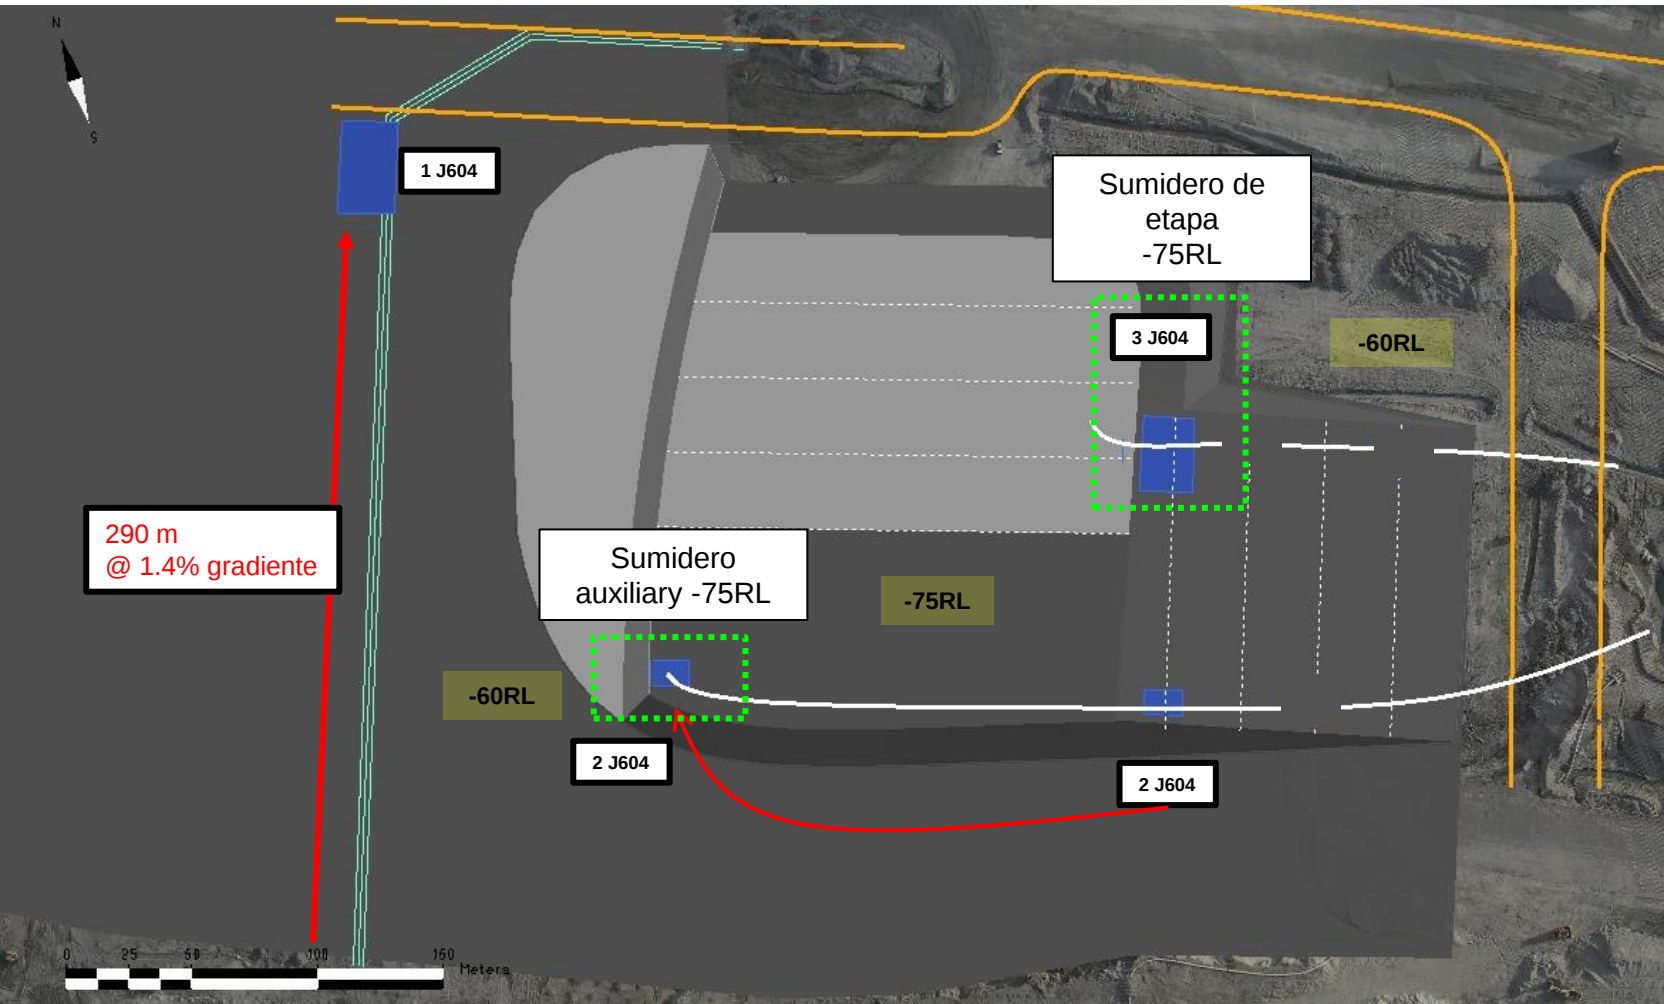

Cut	Ore	Waste	Grand Total
W1	693,666.72	106,350.59	800,017.31
W2	699,967.22		699,967.22
W3	700,035.29		700,035.29
W4	796,816.35		796,816.35
Grand Total	2,890,485.59	106,350.59	2,996,836.18

Producti vidad	100Kt / día				
Nombre de los Bloques	Fechas de detonació n	Fecha de minado	Fecha de inicio de minado	Fecha de culminaci ón de minado	Diferencia de días
W1	27 Sep	10	27 Sep	7 Oct	0
W2	7 Oct	7	7 Oct	14 Oct	2
W3	12 Oct	7	14 Oct	21 Oct	5
W4	16 Oct	8	21 Oct	6 Nov	


Secuencia de minado de -90RL



Cobre

Panamá

Semanas	Días
W 39-40	8
W 41	7
W 42	7
W 43-44	9

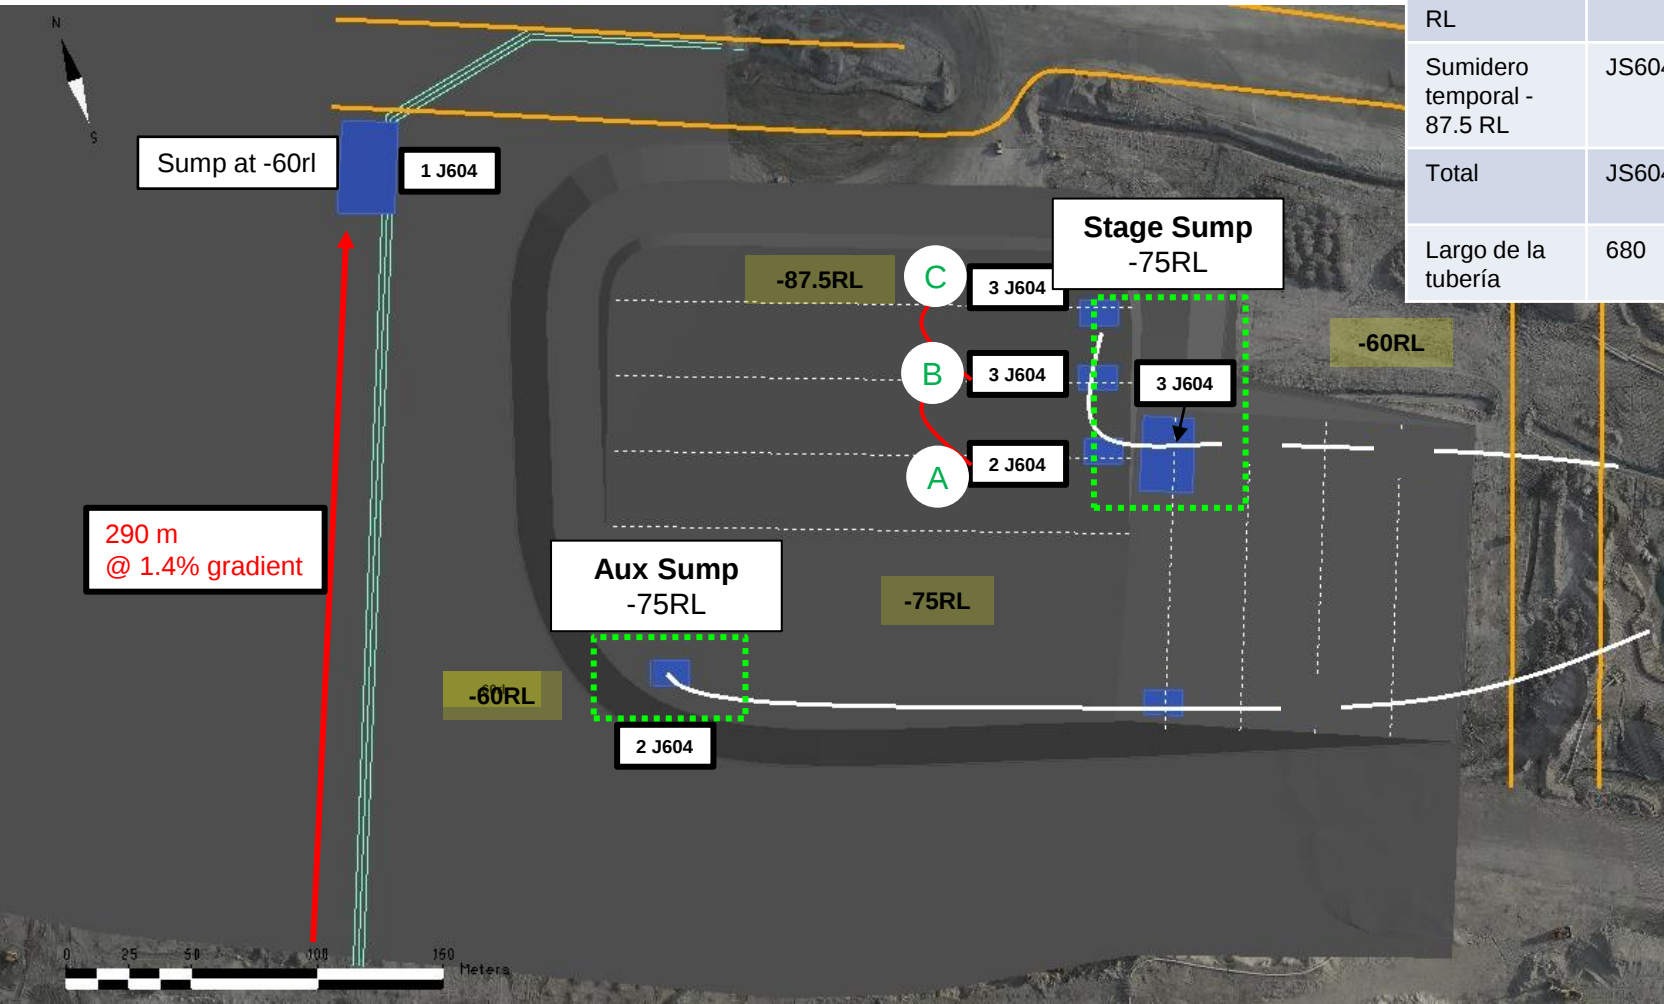

Bombas requeridas	Modelo	Cantidad
Sumidero - 60RL	JS604	1
Sumidero de etapa-75 RL	JS604	3
Sumidero auxiliar -75 RL	JS604	2
Sumidero temporal - 87.5 RL	JS604	3
Total	JS604	9
Largo de la tubería	680	m

Cut	Ore	Waste	Grand Total
W1	693,666.72	106,350.59	800,017.31
W2	699,967.22		699,967.22
W3	700,035.29		700,035.29
W4	796,816.35		796,816.35
Grand Total	2,890,485.59	106,350.59	2,996,836.18

Producti vidad	100Kt / día				
Nombre de los Bloques	Fechas de detonació n	Fecha de minado	Fecha de inicio de minado	Fecha de culminaci ón de minado	Diferencia de días
W1	27 Sep	10	27 Sep	7 Oct	0
W2	7 Oct	7	7 Oct	14 Oct	2
W3	12 Oct	7	14 Oct	21 Oct	5
W4	16 Oct	8	21 Oct	6 Nov	
